川崎工場の太陽光発電

2012年3月30日、川崎工場屋上に設置した472枚の太陽電池パネルで発電を開始してから8年が経過しました。最大出力100kW、年間発電量予測は11万kWhを見込んでいましたが、実際の発電量実績は12年度が129，270kWhでした。

19年度の発電量は115，447kWhで前年度比5．5％減となりましたが、日照時間の減少によるもので、設備は順調に稼働しています。

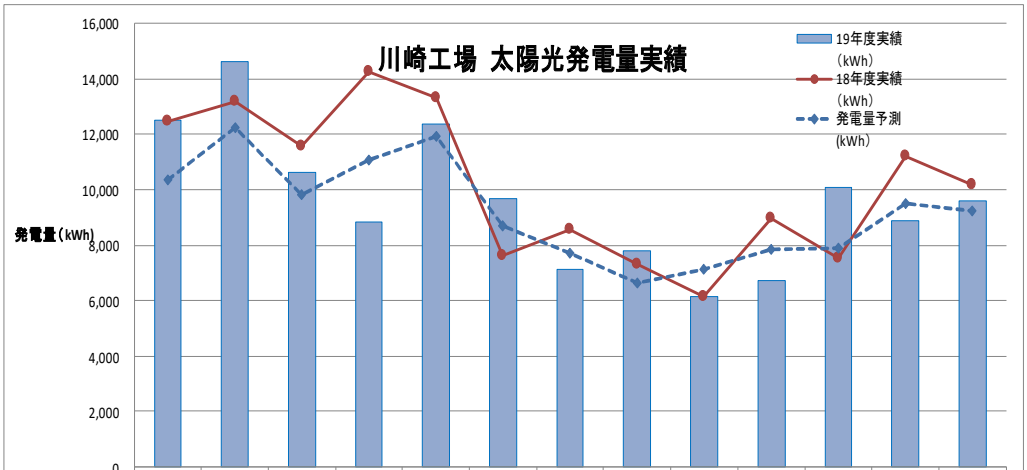

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
19年度実績（kWh）	12,519	14,640	10,618	8,827	12,380	9,682	7,146	7,796	6,151	6,716	10,071	8,902	9,621
18年度実績（kWh）	12,476	13,200	11,595	14,246	13,329	7,617	8,566	7,297	6,148	8,969	7,519	11,232	10,183
発電量予測(kWh)	10,356	12,258	9,812	11,064	11,952	8,715	7,704	6,641	7,141	7,853	7,900	9,528	9,244
